

**ОТЧЕТ О ПРОМЫШЛЕННОМ ВНЕДРЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ НОРМАЛИЗАТОРОВ
ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ НОРМАЛ ®, ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ ESSV**

В соответствии с условиями договора № 5 от 11/02/2013 г. на поставку трёхфазного энергосберегающего нормализатора переменного напряжения серии ESSV-I 3.200-160-02 была произведена установка данного оборудования в ресторане «ОСТРОВ» (ООО «ДИНАСТИЯ») по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская 99-1



Стоимость оборудования составила **185 000 руб.** (Сто восемьдесят пять тысяч) рублей.

Цель установки: предотвратить скачки напряжения, которые вызывают выход из строя электрическое оборудование, сократить затраты на электроэнергию.

Заказчик имеет устойчивое потребление электроэнергии. 11 октября 2013 г. были проведены контрольные замеры с включенным и выключенным стабилизатором. В результате контрольных замеров были получены следующие результаты:

U (V) по токам (при включенном стабилизаторе)	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Среднее
На входе	233	228	232	231
На выходе	217	214	217	216

J (A)	Фаза А	Фаза В	Фаза С
При включенном стабилизаторе	91	84	69
При выключенном стабилизаторе	109	90	78

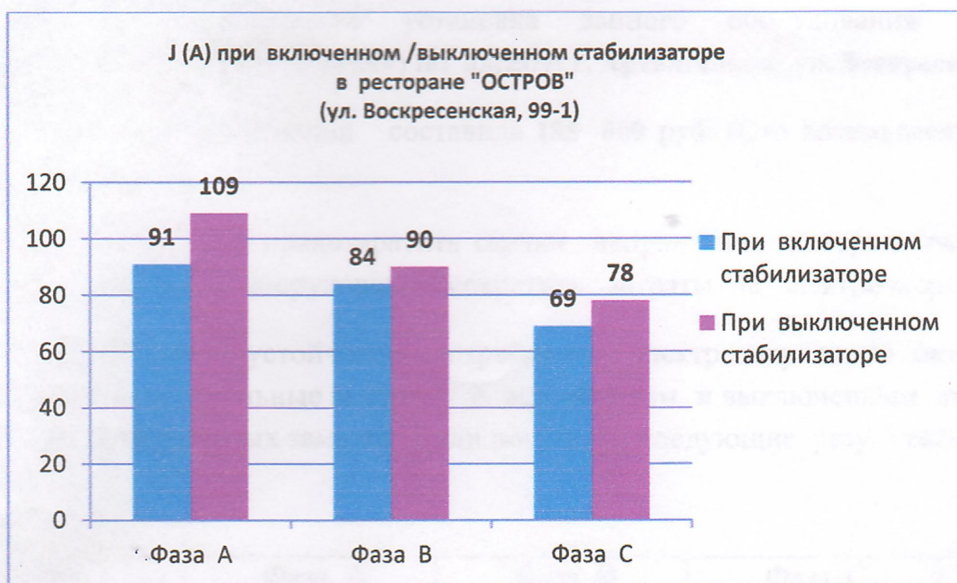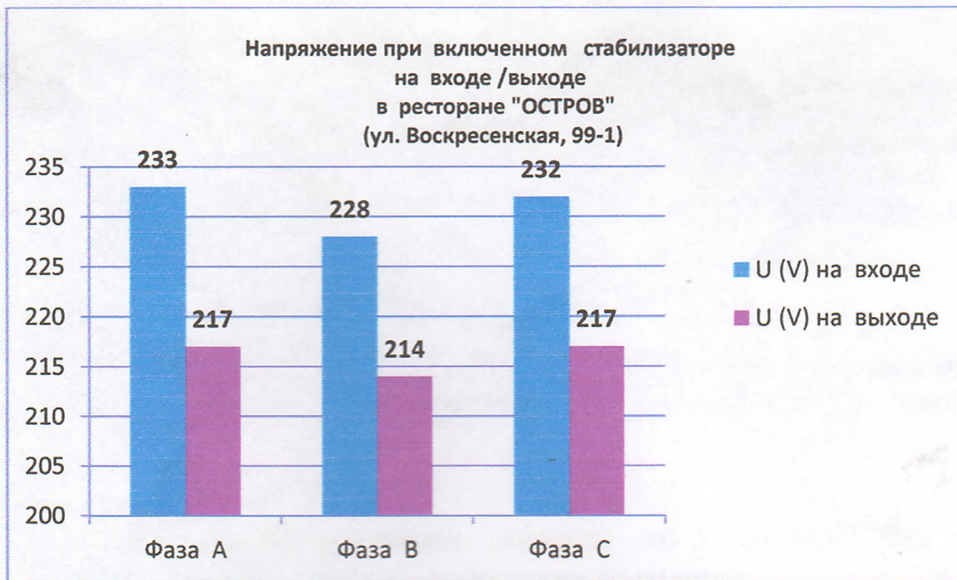

Вывод: Данные, полученные в ходе контрольных измерений в ресторане «ОСТРОВ» по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская 99-1, показали, что применение энергосберегающего нормализатора переменного напряжения серии ESSV-I 3.200-160-02 привело к экономии 18 %.

Директор ООО «ТСК-Энергия»



Зыков В.Г.

Директор ООО «Династия»

Хотеновская В.Л.
